



MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

2009^{Yılı}

Yatırım Programı
İzleme ve
Değerlendirme
Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

<u>İÇİNDEKİLER</u>	<u>SAYFA</u>
1-YÖNETİCİ ÖZETİ	i
2-GENEL DEĞERLENDİRME	1
A-VİZYON.....	1
B-MİSYON.....	1
C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER.....	1
D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI.....	8
E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ.....	9
1-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Alanlarının Dağılımı.....	9
2-Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı.....	10
3-Kuruma Ait Taşıtlar.....	11
4-Lojmanlar.....	11
5-Bilgi ve Teknoloji Kaynakları.....	12
a-Yazılım ve Bilgisayarlar.....	12
b-Kütüphane Kaynakları.....	12
c-Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	13
6-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşınırılarının Dağılımı.....	14
F-2009 YILI YATIMLARIYLA HEDEFLenen ve GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI.....	16
a-Hedeflenen.....	16
b-Gerçekleşen.....	16
G-2009 YILI YATIRIM UYGULAMALARI.....	16
a-Genel Yatırım Uygulama Durumu.....	16
b-Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	17
3-2009 YILI PROJE UYGULAMALARI	18
1-Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	18
2- Kampus Altyapısı	20
3- Derslik ve Merkezi Birimler	22
7- Muhtelif İşler	33
8- Merkezi Araştırma Laboratuvarı.....	37
9-Kamulaştırma.....	39
4-ÖNERİLER	40
5-MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM ÖZETİ	41
6-2009 YILI HARCALAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU	42

1-YÖNETİCİ ÖZETİ



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşüncüyü üstün tutan, farklı görüş ve düşüncelerin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği; özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip; eğitimin toplumsal gelişmeye ve toplumsal kültüre öncülük ettiğine inanan; bilim, teknoloji, öğretim, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir üniversitedir.

Üniversitemizin ana hedefi; bünyesindeki hizmetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için, insan, para ve malzeme gibi kaynakların mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Üniversitemize 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 14.100.000 TL yatırım ödeneği verilmiş, yıl içerisinde Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yatırımları hızlandırma ödeneğinden 3.000.000 TL ek ödenek sağlanmış ayrıca Üniversitemiz öz gelirlerinden ve net finansman fazlalarından 1.769.049 TL ödenek eklenmiş ve yılsonu ödeneği toplamı 18.869.046 TL olmuştur. Üniversitemizin 2009 yılı sonu yatırım harcamaları 18.557.914 TL, harcama oranı ise %98.35 olarak gerçekleşmiştir.

2006 yılında kurulan ve fiziki yapılanması devam eden üniversitemizde yeni yerleşke alanı inşaatlarımız sürmektedir. On üç bin dönümlük bir arazi olan Üniversitemiz Örtülü Yerleşkesi'nin 1750 dönümü projelendirilmiştir. Bu kapsamda; yeni yerleşke alanı yol ve alt yapı çalışmaları ile üç fakülte binasının yapımı sürmektedir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesine göre hazırlanan Üniversitemizin 2009 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımla.

Prof. Gökay YILDIZ
Rektör

2-GENEL DEĞERLENDİRME

A-VİZYON

Bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşüncüyü üstün tutan farklı görüş ve düşüncelerin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği; özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip, eğitimin toplumsal gelişmeye ve toplumsal kültüre öncülük ettiğine inanan, bilim, teknoloji, öğretim, sanat ve spor alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir üniversite olmaktır.

B-MİSYON

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, çağın gerektirdiği, ülkenin ihtiyaç duyduğu, duyuşsal özellikleri yüksek, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere duyarlı, alanının gerektirdiği araştırma, uygulama ve bilimsel yeterliklere sahip, teknoloji okuryazarlığı olan bireyler yetiştirmeyi ve küresel değerleri ulusal değerlerle bütünleştirmeyi, bölge, ülke ve dünya sorunlarına çözüm üretmeyi, ürettiklerini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

C-TEMEL AMAÇ ve HEDEFLER

AMAÇ. 1 (A.1): ÖĞRETİM ELEMANLARIMIZIN ÖZELLİKLERİNİN ULUSLAR ARASI DÜZEYDE KABUL EDİLEBİLİR OLMASINI SAĞLAMAK	
Hedef. 1 (A.1- H.1):	Öğretim elemanlarımızın, 2008 yılında sertifika programlarına katılarak etkili öğrenme ve öğretme sertifikası almaları sağlanacaktır.
Hedef. 2 (A.1- H.2):	Öğretim elemanlarımızın, öğrenciler tarafından değerlendirildiği öğretim elemanı değerlendirme anketlerinin, 2008 yılından itibaren düzenli olarak yapılması sağlanacaktır.
Hedef. 3 (A.1- H.3):	Ulusal yayınların 2008 yılından itibaren her yıl % 20, uluslararası yayınların 2008 yılından itibaren her yıl % 10 artırılması sağlanacaktır.
Hedef. 4 (A.1- H.4):	Proje ile ilgili altyapının oluşturulması ve 2008 yılından itibaren yapılan proje sayısının her yıl % 10 artırılması sağlanacaktır.
Hedef. 5 (A.1- H.5):	Yabancı dil sorunu yaşayan öğretim elemanlarımıza kurs imkânı sağlanarak, 2009 yılı itibariyle öğretim elemanlarımızın yabancı dil yeterliliklerini kazanmaları sağlanacaktır.
Hedef. 6 (A.1- H.6):	Görsel ve internet ortamında üye olunan bilimsel yayın sayısı 2009 yılı sonuna kadar % 50 artırılabilecektir.
Hedef. 8 (A.1- H.8):	Öğretim elemanı değişim programına katılan öğretim elemanı sayısı, 2009 yılından itibaren her yıl % 10 artırılabilecektir.

AMAÇ. 2 (A.2): ÖĞRETİM ELEMANI BAŞINA DÜŞEN ULUSLAR ARASI BİLİMSEL YAYIN SAYISINI ARTTIRMAK, BUNUN İÇİN GEREKLİ DESTEK VE TEŞVİKLERİ SAĞLAMAK

Hedef. 9 (A.2- H.9):	2012 yılına kadar lisansüstü programları % 50 arttırılacaktır.
Hedef. 10 (A.2- H.10):	Üniversitemize bağlı fakültelerimiz ve enstitülerimiz tarafından, 2009 yılı sonunda basılı veya görsel ortamda yayınlanan dergilerin çıkarılması sağlanacaktır.
Hedef. 11 (A.2- H.11):	2009 yılı sonuna kadar bilimsel çalışmalarda disiplinler arası çalışma ortamı oluşturularak, yapılan yayın sayısının % 10 arttırılmasını sağlamak.
Hedef. 12 (A.2- H.12):	Meslek Yüksekokullarında, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının 2012 yılına kadar 50 öğrenci olması sağlanarak, öğretim elemanlarımızın bilimsel yayın yapma imkânları arttırılacaktır.
Hedef. 13 (A.2- H.13):	2009 yılından itibaren, yerel paydaşlarımızla protokoller düzenlenecek ve sağlanan maddi ve diğer kaynaklar ile öğretim elemanlarımızın paydaşlarımızla birlikte yaptıkları bilimsel yayın ve proje sayısı % 10 arttırılacaktır.
Hedef. 14 (A.2- H.14):	Üniversite bünyesinde istatistik ve ekonometri ile ilgili birim veya bölümlerin, 2012 yılına kadar kurularak, bilimsel çalışmalarda bu bölümün etkin rol alması sağlanacaktır.

**AMAÇ. 3 (A.3): MEZUNLARIMIZIN İŞ BULMA SIKINTISI ÇEKMEYEN ARANIR VE
TERCİH EDİLİR ELEMANLAR OLMASINI SAĞLAMAK**

Hedef. 15 (A.3- H.15):	2009 yılından itibaren öğrencilerimizin eğitimleri için gerekli olan bilgisayar laboratuvarları ve diğer laboratuvar imkânlarının her yıl %10 oranında geliştirilmesi sağlanacaktır.
Hedef. 16 (A.3- H.16):	Mezun takip sistemi kurulacak ve 2008 yılından itibaren her mezun olan öğrencimizin bu sisteme dahil edilmesi sağlanacaktır.
Hedef. 17 (A.3- H.17):	Staj zorunluluğu olan birimlerde stajların, paydaşlarımızla hazırlanacak protokol çerçevesinde 2008 yılından itibaren daha etkin yapılması sağlanacaktır.
Hedef. 18(A.3- H.18):	Öğrenci danışmanlık sisteminin etkin hale getirilmesi sağlanacak ve 2009 yılından itibaren, danışman öğretim elemanlarından her dönem raporların alınması ve izlenmesi sağlanacaktır.
Hedef. 19 (A.3- H.19):	2012 yılı sonuna kadar, tüm birimlerimizde yabancı dil hazırlık sınıfı açılması sağlanacaktır.
Hedef. 20 (A.3- H.20):	2010 yılından itibaren çift ana dal ve yan dal programları açılacaktır.
Hedef. 21 (A.3- H.21):	2010 yılına kadar kariyer merkezinin kurulması sağlanacaktır.

AMAÇ.4: (A4) MEZUNLARIMIZIN ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜNÜ KAZANMIŞ OLARAK HAYATA ATILMASINI SAĞLAMAK

Hedef. 22 (A.4- H.22):	2009 yılından itibaren öğrencilerimizin çevre bilinci ve ilk yardım gibi konularındaki bilgilerini artırmak amacıyla eğitim programlarının düzenlenmesi.
Hedef. 23 (A.4- H.23):	2009 yılından itibaren bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinlikler %20 artırılabacaktır.
Hedef. 24 (A.4- H.24):	2009 yılından itibaren öğrencilerimizin düzenlediği etkinliklerin %10 artırılması sağlanacaktır.
Hedef. 25 (A.4- H.25):	2009 yılından itibaren öğrencilerimizin % 10'unun tiyatro, halk oyunları, resim, müzik alanlarındaki etkinliklere katılımı sağlanacaktır.
Hedef. 26 (A.4- H.26):	2009 yılından itibaren yeni öğrencilerimizin uyum programlarına katılımı sağlanacaktır.
Hedef. 27 (A.5- H.27):	Üniversitemiz tarafından düzenlenen etkinliklerin 2009 yılı itibari ile % 10 artırılması sağlanacaktır.
Hedef. 28 (A.5- H.28):	2008 yılından itibaren düzenlenen etkinliklerin bazı ölçme araçları ile değerlendirilmesi yapılarak, kalitelerinin artırılması sağlanacaktır.
Hedef. 29 (A.5- H.29):	2008 yılından itibaren, her ay öğretim elemanlarının katıldığı ve üniversitemizin geleceği ile ilgili olarak görüşlerin alındığı toplantılar düzenlenecek ve öneriler doğrultusunda nihai alınan kararlar uygulamaya konulacaktır.
Hedef. 30 (A.5- H.30):	2012 yılına kadar, üniversitenin bulunduğu çevreye, topluma, sahip olduğu tarihe katkıda bulunacak 6 araştırma merkezi kurulması hedeflenmektedir.
Hedef. 31 (A.5- H.31):	2011 yılı sonunda üniversitemiz içerisinde öğretim elemanlarımızın bir araya gelmesi ile sosyal tesis tamamlanacaktır.
Hedef. 32 (A.5- H.32):	2008 yılından itibaren her yıl tüm akademik ve idari personelimiz için sosyal ve kültürel faaliyetlere yönelik eğitim seminerleri ve sertifika programları düzenlenecektir.
Hedef. 33 (A.5- H.33):	2008 yılından itibaren, her ay öğrenci temsilcileri ile birlikte toplantılar düzenlenecek ve öneriler doğrultusunda alınan kararlar uygulamaya konacaktır.
Hedef. 34 (A.5- H.34):	2008 yılından itibaren ayda en az bir konuda, alanında tanınmış bilim ve sanat adamlarının üniversitemize davet edilerek, toplantı, çalıştay, konferans, seminer, eğitim gibi etkinliklerin düzenlenmesi.

AMAÇ.6: (A6) GELİR KAYNAKLARINI ARTIRARAK BÜTÇE YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN SIKINTILARIN AŞILMASINI SAĞLAMAK.

Hedef. 35 (A.6- H.35):	Döner sermaye gelirleri tespit edilerek, 2009 yılından itibaren bu gelirlerin her yıl %10 artması sağlanacaktır.
Hedef. 36 (A.6- H.36):	2009 yılından itibaren, Sürekli Eğitim Merkezi'nde düzenlenen eğitimler ile elde edilen gelirler her yıl %10 artırılabacaktır.
Hedef. 37 (A.6- H.37):	2012 yılı sonunda, Veteriner Fakültesi'ne bağılı olarak Hayvan Hastanesi kurularak gelir getirici faaliyetlerine başlayacaktır.
Hedef. 38 (A.6- H.38):	2012 yılı sonunda, Veteriner Fakültesi'ne bağılı olarak çiftlik kurularak gelir getirici faaliyetlerine başlayacaktır.
Hedef. 39 (A.6- H.39):	2012 yılına kadar, meslek yüksekokullarımızın kurulduğu bölgenin imkânları ve fırsatları ile ilgili programlar açılacak ve üretilen hizmet ve ürünlerin ekonomik olarak bölgeye ve üniversitemiz bütçesine katkı yapması sağlanacaktır.
Hedef. 40 (A.6- H.40):	2012 yılına kadar, bölge ve yöre halkının ihtiyaçlarını karşılamaya dönük hizmetler sağlanarak, elde edilen gelirlerin %10 artırılması sağlanacaktır.
Hedef. 41 (A.6- H.41):	2008 yılından itibaren, ilçelerde kurulan meslek yüksekokullarımızın ihtiyaçlarının ilçe işadamları ve belediyeler tarafından karşılanması için her yıl düzenli olarak toplantılar yapılacak ve sağlanan kaynaklar her yıl %10 artırılabacaktır.
Hedef. 42 (A.6- H.42):	2008 yılından itibaren, ilçelerde kurulacak meslek yüksekokullarının tüm ihtiyaçları ilçe tarafından karşılandıktan sonra kurulmasına izin verilecektir.

AMAÇ.7: (A7) MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ'NİN TÜM PAYDAŞLARIYLA VE ÇEVRE İLE İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK VE BÖLGE ÜLKE SORUNLARINA DUYARLI BİR ÜNİVERSİTE OLMASINI SAĞLAMAK.

Hedef. 43 (A.7- H.43):	Üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla, 2009 yılından itibaren kurulacak bir birim aracılığıyla sanayi ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği sağlanacaktır.
Hedef. 44 (A.7- H.44):	2009 yılından itibaren, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi aracılığı ile toplum ve sanayi kesimi arasında işbirliği çerçevesinde, her yıl en az bir anlaşma imzalanacaktır.
Hedef. 45 (A.7- H.45):	Yöre sorunlarına yönelik olarak, 2010 yılından itibaren bir veri bankası kurulacaktır.
Hedef. 46 (A.7- H.46):	2009 yılından itibaren, lisansüstü düzeyde ve diğer bilimsel çalışmalara destek verilerek, bunların en az % 10'unun yöre sorunları ile ilgili olması sağlanacaktır.
Hedef. 47 (A.7- H.47):	Yapılacak olan yayın, proje ve diğer bilimsel çalışmaların, 2009 yılından itibaren en az %10'unun bölge ihtiyaçları ile ilgili olması sağlanacaktır.
Hedef. 48 (A.7- H.48):	Paydaşlarımız ile birlikte düzenlenen etkinliklerin sayısının, 2008 yılından itibaren %10 artması sağlanacaktır.
Hedef. 49 (A.7- H.49):	2008 yılından itibaren, düzenlenen her etkinliğe en az iki paydaşımızın katılımı sağlanacaktır.
Hedef. 50 (A.7- H.50):	2009 yılından itibaren öğrencilerimizin en az %1'inin sosyal etkinliklerde görev alması sağlanacaktır.
Hedef. 51 (A.7- H.51):	2009 yılından itibaren, her mezun öğrencimizin en az bir ağaç dikerek mezun olması sağlanacak ve 2012 yılına kadar toplam 25.000 ağaç dikimi gerçekleştirilecektir.

AMAÇ.8(A8) MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ'Nİ, DİĞER ÜNİVERSİTELER ARASINDA ÖNE ÇIKARACAK BİR KİMLİK ORTAYA KOYMAK

Hedef. 53 (A.8- H.53):	2012 yılına kadar, uluslar arası denetim (EUA) için başvurulacaktır.
Hedef. 54 (A.8- H.54):	2012 yılına kadar, Veteriner Fakültesi EAEVE denetiminden geçirilecek ve Türkiye'de Kurulu bulunan Veteriner Fakülteleri içerisinde öne çıkması sağlanacaktır.
Hedef. 55 (A.8- H.55):	2009 yılı itibariyle, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir araştırma merkezi kurulacaktır.
Hedef. 56 (A.8- H.56)	2010 yılı itibariyle, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir müze kurulacaktır.

AMAÇ.9(A9) ÜNİVERSİTEMİZİN YERLEŞKESİNİN FİZİKİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİNİ VE ETKİN KULLANIMINI SAĞLAMAK

Hedef. 57 (A.9- H.57):	2012 YILINDA, Veteriner Fakültesi İnşaatının A, B, C, D, E blokları tamamlanacaktır.
Hedef. 58 (A.9- H.58):	2012 yılında, Eğitim Fakültesi inşaatının % 40'ı tamamlanacaktır.
Hedef. 59 (A.9- H.59):	2012 yılında Fen Edebiyat Fakültesi inşaatının %50' si tamamlanacaktır.
Hedef. 60 (A.9- H.60)	2012 yılında Hayvan Hastanesi İnşaatının %100'ü, çiftlik inşaatının %50'si tamamlanacaktır.
Hedef. 61 (A.9- H.61):	2012 yılında altyapı inşaatlarımızın %10'u tamamlanacaktır.
Hedef. 62 (A.9- H.62):	2012 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin A, B, C, D blokları tamamlanacaktır.

D-YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

2009 YILI YATIRIM ÖDENEKLERİ												
PROJE NO	PROJE TUTARI	2008 ÖDEMESİ	2009 Yılı Başlangıç Ödenekleri	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2009'DA BİTEN 2009HO31830 MUHTELİF İŞLER	2.210.000	0	2.098.000	0	209.000	0	1.055.046	518.000	3.880.046	3.657.509	222.537	94.26
2009 BİTEN 2009HO31820 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	400.000	0	400.000	315.000	0	0	0	0	85.000	84.861	139	99.83
2009 DAN SONRAYA KALAN 2008HO33760 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	25.000.000	9.631.000	10.500.000	0	0	3.000.000	0	0	13.500.000	13.499.710	290	99.99
2009 DAN SONRAYA KALAN 2008HO33750 KAMPÜS ALTYAPI	10.000.000	1.260.000	1.000.000	0	106.000	0	0	0	1.106.000	1.105.031	969	99.91
2009'DA BİTEN 2009K120940 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	14.908	85.092	14.90
KAMULAŞTIRMA	0	0	2.000	0	0	0	196.000	0	198.000	195.895	2.105	98.93
GENEL TOPLAM	35.400.000	10.102.606	14.100.000	315.000	315.000	3.000.000	1.251.046	518.000	18.869.046	18.557.914	311.132	98.35

E-KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ

1. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Açık Alanlarının Dağılımı

YERLEŞKE ADI	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)			
	Üniversite	Maliye Haz.	Diğer	Toplam
EĞİTİM FAKÜLTESİ	0	29.401	0	29.401
VETERİNER FAKÜLTESİ	0	2.699	234	2.933
F.EDEBİYAT-SAĞLIK Y.O	0	3.000	0	3.000
BURDUR MYO	15.897	9.812	112	25.821
GÖLHİSAR MYO	0	49.296	0	49.296
BUCAK HİKMET T. MYO	67.048	12.226	0	79.274
AĞLASUN MYO	0	0	1.252	1.252
BUCAK ZELİHA T. Y.O	11.002	0	26.998	38.000
TEFENNİ MYO	0	14.420	14.420	28.840
ÖRTÜLÜ YENİ KAMPÜS ALANI	7.909.770	0	5.156.650	13.066.420
TOPLAM	8.006.719	117.854	5.199.666	13.324.239

2. Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

	İDARİ BİRİMLER				EĞİTİM ALANLARI									SOSYAL ALANLAR									
BİRİMLER	BÜRO		TOPLANTI SALONU		DERSLİK		LABORATUAR		ATÖLYE - UYGULAMA ALANI		KÜTÜPHANE		SİRKÜLASYON ALANI	KAFETREYA		YEMEKHANE		KONFERANS SALONU		SPOR ALANI (KAPALI)		SPOR ALANI (AÇIK)	
	AD.	M²	AD.	M²	AD.	M²	AD.	M²	AD.	M²	AD.	M²	M²	AD.	M²	AD.	M²	AD.	M²	AD.	M²	AD.	M²
Rektörlük ve İdari Birimler	96	2534	1	57	-	-	-	-	-	-	1	423	574	-	-	-	-	2	1859	-	-	-	-
Eğitim Fakültesi	72	1800	2	90	36	2241	7	513	39	886	-	-	2790	4	594	-	-	-	-	1	920	1	3704
Veteriner Fakültesi	33	700	-	-	4	240	12	480	-	-	-	-	2000	-	-	1	40	1	150	-	-	-	-
Fen-Edebiyat Fakültesi	25	466	-	-	5	274	11	355	-	-	-	-	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fen Bilimleri Enstitüsü	4	70	-	-	2	60	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosyal Bilimler Enstitüsü	4	70	1	35	2	60	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	4	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sağlık Yüksekokulu	21	376	-	-	5	265	3	176	-	-	-	-	232	1	250	1	250	-	-	-	-	-	-
Bucak Zeliha Tolunay	19	993	1	55	28	1168	5	350	3	140	1	75	2614	1	750	1	750	1	700			1	1500
Meslek Yüksekokulu	26	718	1	57	17	1230	8	565	7	1430	1	110	940	1	1100	1	800	1	155			3	4000
Bucak Hikmet Tolunay	23	701	1	79	19	1290	4	250	1	286	1	106	2145	1	600	1	85			1	100	1	400
Bucak Emin Gülmez	15	420			10	550	6	280	2	243			686	1	350	1	250	1	94	-	-	-	-
Göhlisar MYO	19	360	1	60	20	1200	7	420	1	60	1	60	720	1	200	1	350	1	180	-	-	2	4374
Ağlasun MYO	12	240	-	-	11	485	4	180	-	-	1	90	595	1	300	-	-	1	350	1	400	1	400
Tefenni MYO	19	436	1	48	15	720	1	48	-	-	1	21	435	1	101	-	-	1	71	-	-	1	504
Toplam	392	9954	9	481	174	9783	68	3617	53	3045	7	885	13964	11	3958	7	2525	9	3559	3	1420	10	14882

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş ve yeni belirlenen yerleşke alanında kullanıma açılan hizmet binası yoktur. Üniversitemiz halen eğitim-öğretim yapılan ilçelerdeki okullar dahil 9.783 m² derslik, 3617m² laboratuvar, 9954m² çalışma odası, 3559 m² kültür ve kongre merkezi ve 1420 m² kapalı spor alanına sahiptir.

3. Kuruma Ait Taşıtlar

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 9 adet aracı bulunmaktadır.

Taşıtın Cinsi	Adet
Otomobiller	4
Midibüs	4
Pick up	1
TOPLAM	9

4. Lojmanlar

Lojman Tipi	Lojman Sayısı	Sayısı		Kapalı Alan (m ²)
		Dolu	Boş	
Konut	12	12	-	1279
Toplam	12	12	-	1279

5. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

a) Yazılım ve Bilgisayarlar

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)	Toplam
Yazılım	10	18	5	33
Masa Üstü Bilgisayar	550	797	81	1.428
Taşınabilir Bilgisayar	33	23	17	73

b) Kütüphane Kaynakları

Bölümü	Kitap	Periyodik Yayın	Elektronik Yayın	Diğerleri	Toplam
Tıp	51	0	0	0	51
Fen	1.266	30	2.094(e-dergi)	15.000(e-kitap)	18.390
Sosyal	24.651	50	7.699(e-dergi)	17.000(e-kitap)	49.400
Diğerleri	3.794	18	0	0	3.812
TOPLAM	29.762	98	9.793	32.000	71.653

c) Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)	Toplam
Projeksiyon	1	98	0	99
Slayt Makinesi	0	4	0	4
Tepegöz	1	49	0	50
Barkod Okuyucu	0	10	1	11
Baskı Makinesi	11	8	0	19
Fotokopi Makinesi	21	10	0	31
Faks	31	0	0	31
Fotoğraf Makinesi	10	1	13	24
Kameralar (Güvenlik)	211	0	0	211
Televizyonlar	25	25	0	50
Tarayıcılar	7	1	2	10
Müzik Setleri	0	2	0	2
Mikroskoplar	0	29	13	42

6. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taşınırlarının Dağılımı

SIRA NO	TAŞINIR KODU	TAŞINIR ADI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTARI
1	253.02.01	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri	Adet	16
2	253.02.02	İnşaat Makineleri ve Aletleri	Adet	48
3	253.02.03	Atölye Makineleri ve Aletleri	Adet	131
4	253.02.04	İş Makineleri ve Aletleri	Adet	3
5	253.02.05	Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri	Adet	163
6	253.02.08	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri	Adet	1
7	253.02.10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	Adet	23
8	253.03.01	Yıkama, Temizleme ve Ütülleme Cihaz ve Araçları	Adet	31
9	253.03.02	Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri	Adet	107
10	253.03.04	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	Adet	231
11	253.03.05	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler	Adet	83
12	253.03.06	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri	Adet	319
13	253.03.07	Müzik Aletleri ve Aksesuarları	Adet	104
14	253.03.08	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	Adet	4
15	253.03.08	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler	Adet	1
16	255.01.01	Döşeme Demirbaşları	Adet	76
17	255.01.02	Temsil ve Tören Demirbaşları	Adet	318
18	255.01.04	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	Adet	11
19	255.01.05	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	Adet	7
20	255.01.05	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar	Adet	64
21	255.02.01	Bilgisayarlar ve Sunucular	Adet	2.452
22	255.02.01	Bilgisayarlar ve Sunucular	Adet	1
23	255.02.02	Bilgisayar Çevre Birimleri	Adet	434
24	255.02.02	Bilgisayar Çevre Birimleri	Adet	1

SIRA NO	TAŞINIR KODU	TAŞINIR ADI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTARI
25	255.02.03	Teksir ve Çoğaltma Makineleri	Adet	43
26	255.02.04	Haberleşme Cihazları	Adet	458
27	255.02.05	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	Adet	690
28	255.02.06	Aydınlatma Cihazları	Adet	1
29	255.02.99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu	Adet	130
30	255.02.99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu	Adet	1
31	255.03.01	Büro Mobilyaları	Adet	8.661
32	255.03.02	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	Adet	12
33	255.03.02	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar	Adet	114
34	255.03.03	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları	Adet	1.110
35	255.03.04	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları	Adet	10
36	255.03.05	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	Adet	209
37	255.07.01	Kütüphane Mobilyaları	Adet	129
38	255.07.02	Basılı Yayınlar	Adet	17.389
39	255.07.03	Görsel ve İşitsel Kaynaklar	Adet	8
40	255.08.01	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	Adet	109
41	255.08.01	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	Adet	2.073
42	255.08.02	Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar	Adet	291
43	255.09.01	Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	Adet	4
44	255.09.02	Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	Adet	190
45	255.09.03	Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar	Adet	17
47	255.10.02	Kontrol ve Güvenlik Sistemleri	Adet	467
48	255.10.03	Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları	Adet	313
49	255.11.02	Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları	Adet	12
50	255.99.01	Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler	Adet	17
51	255.99.02	Seyyar Tanklar ve Tüpler	Adet	7

F- 2009 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

a- Hedeflenen

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi A, B, C, D, E blokları inşaatının fiziki olarak %90 seviyesine getirilmesi ve Mayıs 2010 tarihinde bitirilmesi planlanmıştır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A, B ve B1 blokları inşaatının fiziki olarak %90'nın tamamlanarak Mayıs 2010 tarihine bitirilmesi planlanmıştır.

Veteriner Fakültesi F, G, H, I blokları inşaatının ihalesinin yapılması hedeflenmiştir.

Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO. İnşaatı yapım işinin ihalesinin yapılması planlanmıştır.

Üniversitemiz yeni yerleşkesinde Fen-Edebiyat Fakültesi A ve B blokları inşaatı yapım işinin ihalesinin yapılması planlanmıştır.

Altyapı-kanalizasyon+yağmur suyu, içme suyu, sulama suyu, yangın hidrant, orta gerilim yer altı hattı, data fiber kablolama hatlarının yapımı ile kanalizasyon arıtma sistemi ihalesinin yapılması planlanmıştır.

b- Gerçekleşen

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi A, B, C, D, E blokları inşaatının fiziki olarak %93'ü tamamlanmıştır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A, B ve B1 blokları inşaatının fiziki olarak %93 tamamlanmıştır.

Veteriner Fakültesi F, G, H, I blokları inşaatının ihalesi yapılmış yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış ve 2009 yılsonu itibari ile fiziki olarak %48'i tamamlanmıştır.

Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO inşaatı yapım işinin ihalesi yapılmış ve yüklenici firma ile sözleşme yapılmıştır.

Fen-Edebiyat Fakültesi A ve B blokları inşaatı yapım işinin ihalesi yapılmış, yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış ve yılsonu itibari ile fiziki olarak %20'si tamamlanmıştır.

G- 2009 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

a- Genel Yatırım Uygulama Durumu

2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 14.100.000 TL yatırım ödeneği verilmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı Yatırımları hızlandırma ödeneğinden 3.000.000 TL ek ödenek sağlanmıştır. Net finansman karşılığı 1.251.046 TL, gelir fazlası karşılığı olarak 518.000 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Yılsonu yatırım ödeneği toplamı 18.869.049 TL olmuştur.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2009 yılsonu yatırım harcamaları 18.557.914 TL olarak gerçekleşmiş, 311.132 TL ödenek iptal edilmiş ve harcama oranı %98.35 olarak gerçekleşmiştir. İptal edilen toplam 311.132 TL ödeneğin 182.000 TL'si taşıt alımı ödeneğidir. Bütçe Kanunu "T" taşıt cetvelinde Üniversitemiz için yer alan taşıtlardan Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 adet hibe taşıt alımına izin verilmiş, Bütçemizde 182.000 TL ödeneği olan 2 adet taşıt alımına izin verilmemiştir.

2009K120940 Proje Numaralı Merkezi Arařtırma Laboratuvarı etüt iřleri iin 100.000 TL deneęin 14.908 TL'si harcanmıř kalanı 2010 yılında kullanılmak zere devredilmiřtir.


b- Yatırım Uygulamalarında Karřılařılan Temel Sorunlar

- Yatırımlar iin yeterli deneęin verilmemesi,
- Yatırım btesinde ęrenci sayılarının dikkate alınmaması,
- İhale srelerinin ok uzun olması,
- Blge halkının niversiteye katkısının yetersiz olması.

3-2009 YILI PROJE UYGULAMALARI

1- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2009H031820
PROJE ADI	ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	ETÜD-PROJE VE MÜŞ.
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2009-2009
PROJE TUTARI	400.000 TL

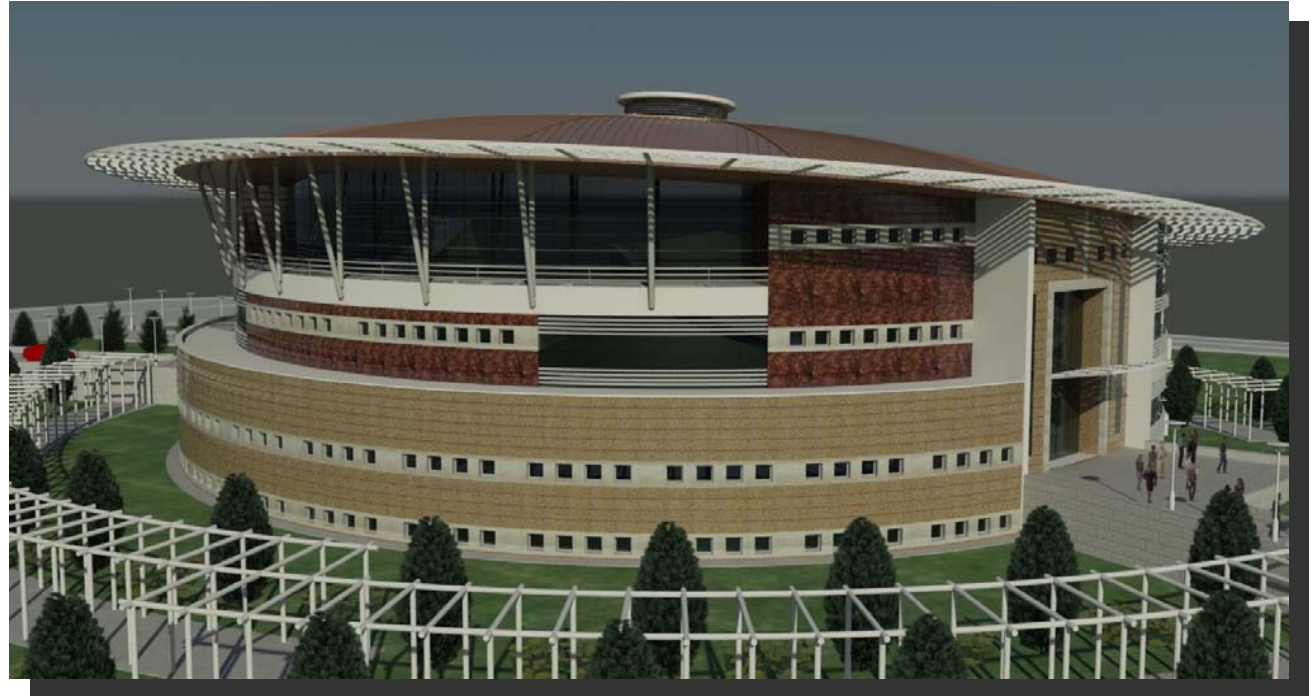

PROJE NO	PROJE TUTARI	2008 Kümülatif Harcama	2009 Yılı Başlangıç Ödeneği	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2009 BİTEN 2009H031820 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	400.000	0	400.000	315.000	0	0	0	0	85.000	84.861	139	99.83

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI	FİZİKİ GERÇEKLEŞME
MAKÜ ÖRTÜLÜ KAMPUSU KÜTÜPHANESİ PROJELERİNİN YAPTIRILMASI İŞİ	Yapı İşleri	70.800,00	MAKÜ Örtülü Kampusu Projesi yaptırılması işi 09.07.2009 tarihinde ihale edilmiş, 30.07.2009 tarihinde işe başlanılmış olup söz konusu iş 27.10.2009 tarihinde idaremize teslim edilmiştir.	% 100
MAKÜ ÖRTÜLÜ KAMPUSU KÜTÜPHANESİ PROJELERİNİN YAPTIRILMASI İŞİ	Yapı İşleri	7.493,00	MAKÜ Örtülü Kampusunda yapımına devam edilen yeni yerleşke sahasının elektrik ihtiyacını karşılamak için TEDAŞ' a ait enerji hatlarından yeraltı kablosuyla elektrik alınması projesinin yapımı ve TEDAŞ' a onaylatılması işi 21.10.2009 tarihli fatura ile satın alınmıştır.	% 100
MAKÜ ÖRTÜLÜ KAMPUSU KÜTÜPHANESİ PROJELERİNİN YAPTIRILMASI İŞİ	Yapı İşleri	6.195,00	Üniversitemiz bağlı birimlerinden; Rektörlük binası, Mehmetçik blok, Meslek Yüksekokulu, Konferans ve Sergi Salonu, Yemekhane ve Sağlık Yüksekokulu binalarının doğalgaz tesisat projelerinin yaptırılması işi 18.12.2009 tarihli fatura ile satın alınmıştır.	% 100
İŞLETME FAALİYET BİLGİ FORMUNUN HAZIRLATILMASI İŞİ	Yapı İşleri	373,00	Rektörlüğümüz yeni kampus sahasında mevcut ariyet ocağı için düzenlenip İl Özel İdaresine verilmek üzere hazırlatılan dosya ücreti.	% 100

2-KAMPUS ALTYAPISI

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2008H033750
PROJE ADI	KAMPUS ALTYAPISI
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	KNL., ELK., SU., ÇEV. D., DOĞAL GAZ, YOL, ISI MRK., ART., TRF, TLF.
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2009-2010
PROJE TUTARI	10.000.000 TL



PROJE NO	PROJE TUTARI	2008 Kümülatif Harcama	2009 Yılı Başlangıç Ödeneği	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılınsu Toplam Ödenek Tutarı	Yılınsu Harcama Tutarı	Yılınsu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgeliir				
2009 DAN SONRAYA KALAN 2008HO33750 KAMPÜS ALTYAPI	10.000.000	1.260.000	1.000.000	0	106.000	0	0	0	1.106.000	1.105.031	969	99.91

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2009 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	2008 KÜMÜLATİF HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI	FİZİKİ GERÇ.
MAKÜ YENİ KAMPUS SAHASI İÇERİSİNDEKİ YOLLARIN YAPILMASI, TOPRAK İŞLERİ VE SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ	Yapı İşl. ve Tek. Daire Başk.	1.105.031	MAKÜ yeni kampus sahası içerisindeki yolların yapılması, toprak işleri ve sanat yapıları yapım işi 27.06.2008 tarihinde ihale edilmiş 28.07.2008 tarihinde işin yapımına başlanılmıştır. İş artışı ile birlikte 03.11.2008 tarihinde iş teslim edilmiştir.	% 100

3- DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER

SEKTÖRÜ	Eğitim-Yüksek Öğretim
PROJE NO	2008H033760
PROJE ADI	Derslik ve Merkezi Birimlerin Yapımı
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	İNŞAAT (30.000 m ²) + DONANIM
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2008 - 2011
PROJE TUTARI	25.000.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2008 Kümülatif Harcama	2009 Yılı Başlangıç Ödeneği	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2009 DAN SONRAYA KALAN 2008H033760 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	25.000.000	9.631.000	10.500.000	0	0	3.000.000	0	0	13.500.000	13.499.710	290	99.99



İŞİN ADI	MAKÜ VETERİNER FAKÜLTESİ (A, B, C, D, E BLOK) İNŞAATI YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	İNŞAAT
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	16.121.495,50 TL.
İHALE BEDELİ	12.690.546,00 TL.
YÜKLENİCİ FİRMA	YEŞİLOVA TEKSTİL ÜRÜNLERİ MADEN. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
İHALE TARİHİ	16.06.2008
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	11.07.2008
YER TESLİM TARİHİ	14.07.2008
İŞİN SÜRESİ	776 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	28.08.2010
2008 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	8.374.026,37 TL. (2009 Yılı Fiyatları ile 9.027.283 TL)
2008 YILI SONU FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 66
2009 YILINDA YAPILAN HARCAMA	3.450.918,25 TL.
2009 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 93



İŞİN ADI	MAKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ A , B VE B1 BLOKLARI İNŞAATI YAPIMI
İŞİN NİTELİĞİ	İNŞAAT
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	4.093.421,89 TL
İHALE BEDELİ	3.510.689,37 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	KARTAL İNŞ. SAN. TİC .NAKL. LTD. ŞTİ.
İHALE TARİHİ	09.09.2008
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	10.10.2008
YER TESLİM TARİHİ	13.10.2008
İŞİN SÜRESİ	700 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	13.09.2010
2008 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	559.962,66 TL (2009 Yılı Fiyatları ile 603.644 TL)
2008 YILI SONU FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 16
2009 YILINDA YAPILAN HARCAMA	2.691.581,27 TL
2009 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 93



İŞİN ADI	MAKÜ VETERİNER FAKÜLTESİ (F, G, H, I) BLOKLARI İKMAL İNŞAATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIMI
İŞİN NİTELİĞİ	İNŞAAT
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	6.917.725,29 TL
İHALE BEDELİ	5.468.089,28 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	YEŞİLOVA İNŞAAT LTD.ŞTİ-ERÇELİK İNŞAAT LTD. ŞTİ. ORTAK GİRİŞİM
İHALE TARİHİ	06.05.2009
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	25.05.2009
YER TESLİM TARİHİ	27.05.2009
İŞİN SÜRESİ	840 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	13.09.2011
2008 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	0
2008 YILI SONU FİZİKİ GERÇEKLEŞME	0
2009 YILINDA YAPILAN HARCAMA	2.633.623,30 TL
2009 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 48



İŞİN ADI	BUCAK EMİN GÜLMEZ TEKNİK BİLİMLER MYO İNŞAATI YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	İNŞAAT
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	5.197.082,26 TL
İHALE BEDELİ	4.351.018,18 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	GÜNDÜZ İNŞAAT TİCARET - KANUNİ BÜLENT GÜNDÜZ
İHALE TARİHİ	15.09.2009
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	04.11.2009
YER VE TESLİM TARİHİ	09.11.2009
İŞİN SÜRESİ	653 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	23.08.2011
2008 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	0
2008 YILI SONU FİZİKİ GERÇEKLEŞME	0
2009 YILINDA YAPILAN HARCAMA	0
2009 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	0

İŞİN ADI	FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ A VE B BLOKLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ
İŞİN NİTELİĞİ	İNŞAAT
DAİRESİ	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
YAKLAŞIK MALİYETİ	30.746.697,31 TL
İHALE BEDELİ	23.455.408,58 TL
YÜKLENİCİ FİRMA	DEMARS İNŞ. TURZ. TİC. LTD. ŞTİ.
İHALE TARİHİ	06.03.2009
İHALE USULÜ	AÇIK İHALE USULÜ
SÖZLEŞME TARİHİ	07.08.2009
YER VE TESLİM TARİHİ	11.08.2009
İŞİN SÜRESİ	872 GÜN
İŞİN BİTİM TARİHİ	30.12.2011
2008 YILI SONUNA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA	0
2008 YILI SONU FİZİKİ GERÇEKLEŞME	0
2009 YILINDA YAPILAN HARCAMA	4.723.585,87 TL
2009 YILI SONU TOPLAM FİZİKİ GERÇEKLEŞME	% 20



4-

MUHTELİF İŞLER

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	2009H031830
PROJE ADI	MUHTELİF İŞLER
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	B. ON-TAD. MAK. TEÇ. BİL. DON. YAZ. ALT. BAK.ON., İD. YEN. KÜT. YAY. AL., TAŞIT
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2009-2009
PROJE TUTARI	2.098.000 TL

PROJE NO PROJE ADI	PROJE TUTARI	2008 Kümülatif Harcama	2009 Yılı Başlangıç Ödeneği	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2009 DA BİTEN 2009H031830 MUHTELİF İŞLER	2.098.000	0	2.098.000	0	209.000	0	1.055.046	518.000	3.880.046	3.657.509	222.537	94

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2009 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
PİK DÖKÜM AYAKLI SERT VEYA ORTA SERT AĞAÇ DÖŞEMELİ OTURMA GRUBU ALIMI İŞİ	Yapı İşl. ve Tek. Daire Başk.	86.829,12	Rektörlüğümüze bağlı birimlerde kullanılmak üzere satın alınan 336 adet bank istekte bulunan birimlere dağıtımı yapılmıştır.
ÖĞRENCİ EVİ İKMAL İNŞAATI VE MERKEZ KAMPUS YAĞMUR KANALI İLE IZGARA YAPIMI İŞİ	Yapı İşl. ve Tek. Daire Başk.	429.834,72	Öğrenci Evi İkmal İnşaatı ve Merkez Kampus Yağmur Kanalı ile Izgara Yapımı işi 06.03.2009 tarihinde ihale edilmiş 17.04.2009 tarihinde sözleşmesi yapıp işe başlanmıştır. Söz konusu iş % 5,1 iş artışı yapılarak 29.07.2009 tarihinde tamamlanıp idaremize teslim edilmiştir.
AĞLASUN MYO VOLEYBOL SAHASININ ÇELİK KARGAS İLE DONATILIP BRANDA İLE KAPATILMASI YAPIM İŞİ.	Yapı İşl. ve Tek. Daire Başk.	69.915,00	Ağlasun MYO Voleybol Sahasının Çelik Karkas ile Donatılıp Branda İle Kapatılması Yapım İşi 10.04.2009 tarihinde ihale edilmiş 18.05.2009 tarihinde sözleşmesi yapıp işe başlanmıştır. Söz konusu iş 21.06.2009 tarihinde tamamlanıp idaremize teslim edilmiştir.
MAKÜ MERKEZ KAMPUSÜ M-B BLOK TADİLATI İNŞAATI YAPIM İŞİ.	Yapı İşl. ve Tek. Daire Başk.	430.224,98	MAKÜ Merkez kampusu M-B Blok tadilatı İnşaatı Yapım İşi 20.05.2009 tarihinde ihale edilmiş 08.06.2009 tarihinde sözleşmesi yapılacaktır. Söz konusu iş %10 iş artışı yapılarak 25.08.2009 tarihinde tamamlanıp idaremize teslim edilmiştir.
BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYG. TEKN. VE İŞLETMECİLİK YO. TERAS ÇATI YAPIMI İŞİ	Yapı İşl. ve Tek. Daire Başk.	126.260,00	Bucak Zeliha Tolunay Uyg. Tekn. ve İşletmecilik YO. Teras Çatı Yapımı İş 13.05.2009 tarihinde ihale edilmiş 28.05.2009 tarihinde sözleşmesi yapıp işe başlanmıştır. Söz konusu iş 12.07.2009 tarihinde tamamlanıp idaremize teslim edilmiştir.
MAKÜ MESLEK YÜKSEKOKULU TADİLATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ	Yapı İşl. ve Tek. Daire Başk.	742.982,28	MAKÜ Meslek Yüksekokulu Tadilatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İş 08.06.2009 tarihinde ihale edilmiş 29.06.2009 tarihinde sözleşmesi yapıp işe başlanmıştır. Söz konusu iş %10 iş artışı yapılarak 26.09.2009 tarihinde idaremize teslim edilmiştir.
GÖLHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU EK BİNA TADİLATI YAPIMI İŞİ	Yapı İşl. ve Tek. Daire Başk.	238.242,00	Göhlisar Meslek Yüksekokulu Ek Bina Tadilatı Yapımı İş 22.06.2009 tarihinde ihale edilmiş 20.07.2009 tarihinde sözleşmesi yapıp işe başlanmıştır. Söz konusu iş 02.10.2009 tarihinde idaremize teslim edilmiştir.
EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIFLARINA SIRA YAPTIRILMASI VE MONTAJI İŞİ	Yapı İşl. ve Tek. Daire Başk.	75.470,63	Eğitim Fakültesi Sınıflarına Sıra Yapılması ve Montajı Yapım İş 07.07.2009 tarihinde ihale edilmiş 29.07.2009 tarihinde sözleşmesi yapıp işe başlanmıştır. Söz konusu iş 11.09.2009 tarihinde idaremize teslim edilmiştir.

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
REKTÖRLÜK MERKEZ KAMPUSU KAZAN DAİRELERİNİN DOĞALGAZA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ	Yapı İşl. ve Tek. Daire Başk.	196.235,35	Rektörlük Merkez Kampusu kazan dairelerinin doğalgaza dönüştürülmesi işinin sözleşmesi 17.09.2009 tarihinde yapılmış ve işe başlanmıştır. Söz konusu iş %10 iş artışı yapılarak 13.11.2009 tarihinde idaremize teslim edilmiştir.
MAKÜ ÖRTÜLÜ KAMPUSU SAHA DÜZENLENMESİ VE HAFRIYATI YAPIM İŞİ	Yapı İşl. ve Tek. Daire Başk.	123.358,95	MAKÜ Örtülü Kampusu Saha Düzenlenmesi ve Hafriyatı Yapım işi 8.10.2009 tarihinde başlamış olup söz konusu iş %20 iş artışı yapılarak 20.11.2009 tarihinde idaremize teslim edilmiştir.
MESLEK YÜKSEKOKULU ÇATISI TADİLATI İLE DIŞ CEPHESİNİN BOYANMASI İŞİ	Yapı İşl. ve Tek. Daire Başk.	62.530,00	Meslek Yüksekokulu çatısı tadilatı ile dış cephesinin boyanması işinin sözleşmesi 07.09.2009 tarihinde yapılmış ve işe başlanmıştır. Söz konusu iş 28.09.2009 tarihinde idaremize teslim edilmiştir.
BİLGİSAYAR ALIMLARI	İMİD	299.692,56	Bilgisayar Alımları
MUHTELİF İŞLER	İMİD	294.908,01	İşyeri Makine Teçhizat Alımları
CNC DİK İŞLEME MERKEZİ İÇİN EKİPMAN ALIMI	MYO	23.000,00	Makine Atölyesinde kullanılmak üzere 1 Adet CNC Dik İşleme Ekipmanı Alımı
YABANCI DİLDE KİTAP	KÜTÜPHANE	78.778,74	559 Kalem Kitap Alımı
TÜRKÇE KİTAP	KÜTÜPHANE	45.988,61	2408 Kalem Kitap Alımı
VERİ TABANI	KÜTÜPHANE	88.657,03	3 Adet Optik Yayın Alımı
BİLGİSAYAR PROG. VE VERİ TABANI OLUŞTURMA	ÖĞRENCİ İŞL.	30.000,00	Bilgisayar programı ve veri tabanı oluşturma

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
AĞ DONANIM CİHAZLARININ ALIM	BİLGİ İŞLEM	90.567,00	Ağ donanım cihazlarının alımı
SPOR MALZEMESİ ALIM	SKS	89.415,68	Üniversitemiz sağlık ve spor merkezine 7 kalem kardio cihazı ve 20 kalem kas geliştirme ve jimnastik aletleri alımı yapılmıştır.
VÜCUT ANALİZATÖRÜ ALIM	SKS	34.619,40	Üniversitemiz sağlık ve spor merkezi için 1 adet vücut analizatörü alınmıştır.

5-MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

SEKTÖRÜ	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
PROJE NO	2009K120940
PROJE ADI	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	ETÜD
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2009
PROJE TUTARI	100.000 TL

PROJE NO	PROJE TUTARI	2008 Kümülatif Harcama	2009 Yılı Başlangıç Ödeneği	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
2009'DA BİTEN 2009K120940 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABATATUVARI	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	14.908	85.092	14.90

İLGİLİ PROJE ÖDENEĞİ İLE 2009 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
FRANSA CUMHURİYETİNDE (ND) BULUNAN CEPPA DE SAVOI ENSTİTÜSÜNDE ARAŞTIRMA	Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi	11.252,76	Fransa Cumhuriyetinde (ND) bulunan CEPPA de Savoi enstitüsünde araştırma için giden Prof. Dr. M. Zeki YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Ümit KEBAPÇI ve Ali Nihat GÜNDÜZALP'E 09-15/EKİM/2009 arasına ait yurtdışı yol, gündelik ve konaklama harcaması
LABORATUARDA İHTİYAÇ DUYULACAK MAKİNE TEÇHİZATIN BELİRLENMESİ İÇİN İSTANBUL VE İZMİR'DE BULUNAN FUARLARA KATILIM	Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi	1.329,50	Laboratuarda ihtiyaç duyulacak makine teçhizatın belirlenmesi İstanbul ve İzmir de bulunan fuarlara katılım için Prof. Dr. Hikmet ALTUNAY, Yrd. Doç. Dr. Fatma ŞAHİNDOKUYUCU ve Yrd. Doç. Dr. Alparslan Kadir DEVRİM'E ait 07-13.03.2009 arasında yurtiçi yol, gündelik ve konaklama harcaması
LABORATUARDA İHTİYAÇ DUYULACAK MAKİNE TEÇHİZATIN BELİRLENMESİ İÇİN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, IŞIK ÜNİVERSİTESİ VE BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNDE İNCELEME	Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi	1.596,00	Laboratuarda ihtiyaç duyulacak makine teçhizatın belirlenmesi için İstanbul Teknik Üniversitesi, Işık Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde inceleme yapmak için giden Yrd. Doç. Dr. Belgin BARDAKÇI, Yrd. Doç. Dr. Songül ŞEN, Yrd. Doç. Dr. Ümit KEBAPÇI ve Yrd. Doç. Dr. Şükrü ÖZÜDOĞRU' YA 03-09 MAYIS 2009 arasında yurtiçi yol, gündelik ve konaklama harcaması
İZMİR'DE BULUNAN TSE VE EGE ÜNİVERSİTESİ AMBALAJ LABORATUARLARINDA, ANKARA ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ LABORATUARINDA İNCELEME	Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi	340,00	İzmir'de bulunan TSE ve Ege Üniversitesi Ambalaj Laboratuvarlarında 8-11 MAYIS 2009, Ankara Üniversitesi Merkezi Laboratuvarında 4 MAYIS 2009 da inceleme yapmak için giden Yrd. Doç. Dr. Seval Sevgi KIRDAR'A yurtiçi yol, gündelik ve konaklama harcaması
LABORATUARDA İHTİYAÇ DUYULACAK MAKİNE TEÇHİZATIN BELİRLENMESİ İÇİN İSTANBUL'DA BULUNAN FUARA KATILIM	Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi	180,00	Laboratuarda ihtiyaç duyulacak makine teçhizatın belirlenmesi için İstanbul'da bulunan fuara katılım için Yrd. Doç. Dr. Afşin KÖKER'E 7-8 MART 2009 da yurtiçi yol, gündelik ve konaklama harcaması
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNİN "UYGULAMALI OVOSİT MİKROMANÜPLASYONU VE MİKROENJEKSİYON KURSU"NA KATILIM	Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi	210,00	Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin "Uygulamalı Ovosit Mikromanüplasyonu ve Mikroenjeksiyon Kursu"na katılım için Yrd. Doç. Dr. Afşin KÖKER'E 4-5 NİSAN 2009 da yurtiçi yol, gündelik ve konaklama harcaması

6 –KAMULAŞTIRMA

SEKTÖRÜ	EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM
PROJE NO	
PROJE ADI	KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ
PROJE YERİ	BURDUR
KARAKTERİSTİK	
PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI	2009
PROJE TUTARI	

PROJE NO	PROJE TUTARI	2008 Kümülatif Harcama	2009 Yılı Başlangıç Ödeneği	Kurum içi Aktarma		Ödenek Ekleme			Yılsonu Toplam Ödenek Tutarı	Yılsonu Harcama Tutarı	Yılsonu İptal Edilen Ödenek Tutarı	Harcama Oranı %
				Düşülen	Eklenen	Eklenen DPT	Eklenen Likit	Eklenen Özgelir				
KAMULAŞTIRMA	-	0	2.000	0	0	0	196.000	0	198.000	195.895	2.105	98.93

İLGİLİ ÖDENEK İLE 2009 YILINDA YAPILAN İŞLER

İŞİN ADI	HARCAMAYI YAPAN BİRİM	HARCAMA	HARCAMA İLE YAPILAN İŞ VE MİKTARI
YENİ KAMPUS SAHASININ KAMULAŞTIRILMASI	Yapı İşleri	195.895,00	MAKÜ Yeni Kampus alanında mülkiyeti özel kişiliklere ait taşınmazların kamulaştırma işlemleri yapılmaktadır.

4-ÖNERİLER

- Yatırım bütçesi verilirken üniversitelerin öğrenci sayıları dikkate alınmalı ve özellikle yeni kurulan üniversitelere performansa dayalı yatırım bütçesi verilmeli,
- 4734 Sayılı Kamu İhale Yasasında değişiklik yapılarak gereksiz itirazlar zorlaştırılmalı ve ihale süreçleri kısaltılmalı,
- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin yatırımlarında bölge halkının katkısı sağlanmalı.

5-MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM ÖZETİ

Bütçe Türü: Özel Bütçe

2009 Yılı Fiyatlarıyla(Bin TL)

SEKTÖR	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI		2008 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA			2009 YILI PROGRAM ÖDENEK			2009 YILI REVİZE ÖDENEK			2009 YILI BAŞINDAN DÖNEM SONUNA KADAR NAKDİ GERÇEKLEŞTİRME		
				Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
		Dış	Toplam	Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak		Kredi	Öz kaynak	
Tarım	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Madencilik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İmalat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enerji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulaştırma-Hab.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turizm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eğitim	4		38.965		10.891	10.891		13.998	13.998		18.571	18.571		18.348	18.348
Sağlık	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.Kamu Hizm.	1		100	-	-	-	-	100	100		100	100		15	15
İktisadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosyal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	5		39.065		10.8914	10.891		14.098	14.098		18.671	18.671		18.363	18.363

6- 2009 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU

2009 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL)

Kuruluş Adı: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ																
Sektör Adı: EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM																
Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2008 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Öz kaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Öz kaynak (17)	Harcama Toplam (18)
5750	476	2009H031820	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2009	Burdur	0	85	0	0	0	85	-315	0	0	85
5751	476	2008H033750	Kampus Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2010	Burdur	0	10.000	1.260	0	0	1.106	+106	0	0	1.105
5752	476	2008H033760	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2011	Burdur	0	25.000	9.631	0	0	13.500	0	0	0	13.500
5753	476	2009H031830	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2009	Burdur	0	3.880	0	0	0	3.880	+209		0	3.658
5754	476		Muhtelif İşler	DİĞERLERİ	2009	Burdur	0		0	0	0	112	0	0	0	(Hibe) 40
TOPLAM							0	38.965	10.891	0	0	18.571	0	0	0	18.348

Sektör Adı: DKH-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

Birim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2007 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Öz kaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Öz kaynak (17)	Harcama Toplam (18)
6187	476	2009K120940	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	ÖZEL BÜTÇE	2009	Burdur	0	100	0	0	0	100	0	0	0	15
TOPLAM							0	100	0	0	0	0	0	0	0	15

www.mehmetakif.edu.tr

Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Bahçelievler Mah. 15100 BURDUR
Telefon : 0 248 212 27 00
Faks : 0 248 212 27 18
